



**Итоги работы
муниципального проектного комитета
и муниципального проектного офиса
за 2018 год
и задачи на 2019 год**

г. Мирный
февраль 2019 г.

Развитие нормативно-методологической базы




Внесены изменения в составы МПК и МПО

(пост. № 212 от 20.02.18, № 742 от 31.05.18):



Утвержден Регламент управления проектами

(пост. № 759 от 01.06.18):




В связи с кадровыми перестановками Департамента процессного и проектного управления **не предоставлены шаблоны для разработки на уровне муниципальных образований:**

- регламента управления портфелями проектов;
- модели компетенций сотрудников на участие в проектной деятельности.

Повышение квалификации сотрудников в области проектного управления



Обучение по курсам проектного управления в 2018 году прошли 27 человек:

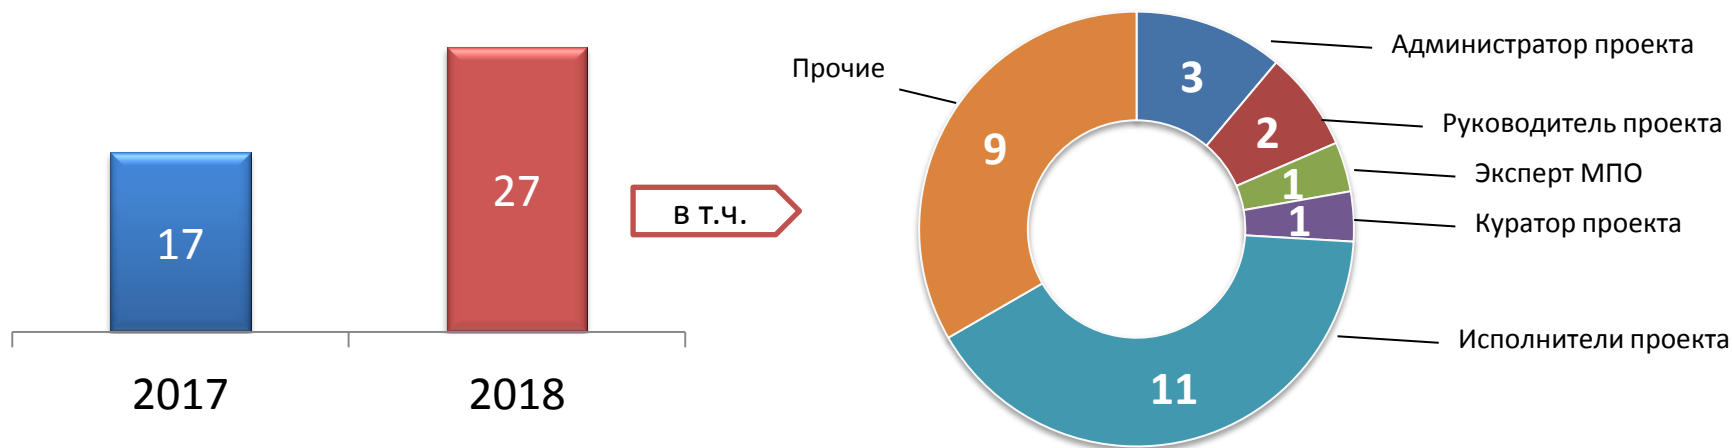


Не осуществлена международная сертификация персонала по категории «проектный специалист» в связи с тем, что ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе РС(Я)» принято решение о получении лицензии на право проведения обучения самостоятельно без участия органа по сертификации из г. Москва

Популяризация и освещение проектного управления



✓ Размещение информации о реализации проектов и механизмах проектного управления на сайте алмазный-край.рф, на республиканских и российских сайтах:

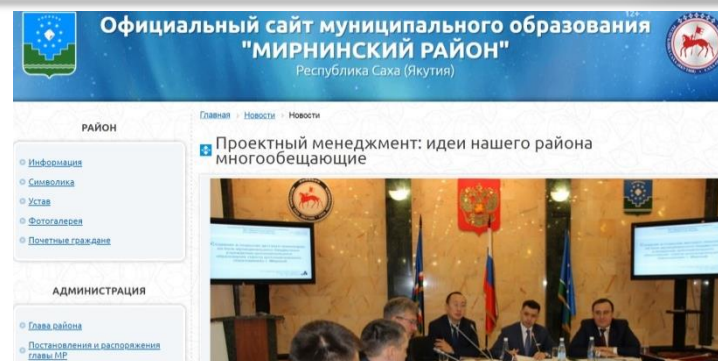

✓ Преподавателем ГАУ ДПО «ВШИМ при Главе РС(Я)» проведена серия лекций участникам молодежного форума «Вилюй»:



✓ Предоставление муниципальной практики реализации проектов при участии в конкурсах и конференциях:




Координация муниципальных проектов



Проведено 9 заседаний МПК и МПО:

в т.ч. 1 заседание с
участием **ЦПК РС(Я)**
15.02.2018 г.



Реализовано 3 проекта:

■ 2017 ■ 2018



- «Молоко – первоклассникам»
- «Спортзал для лица»
- «Детский технопарк»
- «Школьное питание»

- «Молоко – первоклассникам»
- «Центр социального предпринимательства»
- «Детский технопарк»

Реализованные муниципальные проекты



ПРОЕКТ

«Молоко – первоклассникам»



Сроки реализации

запуск	завершение
17.01.18	план – 20.12.18
	факт – 30.05.18



Финансирование

план	факт
2 956 т.р.	1 315,96 т.р. (на момент досрочного завершения)
	2 952,6 т.р. (на 31.12.19)



Ключевые показатели

	план	факт
Охват молочным питанием первоклассников	100%	100%
	1 158 чел.	1 158 чел.

- **Продукт проекта:** предоставление первоклассникам Мирнинского района молочных продуктов не менее 2-х раз в неделю в течение учебного года
- **Реализованные риски:** задержка доставки молочной продукции в связи с ограниченностью доступа в определенные поселения в межсезонье (10.04.18-15.05.18, 15.10.18-01.12.18)
- **Постпроектный мониторинг:** установлен на 01.01.19-10.12.19

Реализованные муниципальные проекты



ЗАВЕРШЕН
ДОСРОЧНО

ПРОЕКТ «Молоко – первоклассникам»



• Результат:

- 2 раза в неделю согласно заявкам во все школы (17 школ) Мирнинского района для первоклассников поступала молочная продукция в индивидуальной асептической упаковке объемом 200 мл;
- оздоровление детей, воспитание культуры здорового питания;
- поддержка местного производства молочной продукции (МУП «Мирнинский молокозавод»)

Реализованные муниципальные проекты



ЗАВЕРШЕН

ПРОЕКТ

«Открытие Центра социального предпринимательства»



Сроки реализации

запуск	завершение
план – 01.12.17	01.04.18
факт – 01.02.18	



Финансирование

план	факт
1 110 т.р.	1 446,3 т.р.



Ключевые показатели

	план	факт
Наполняемость Центра социального предприниматель ства	100%	100%

- **Продукт проекта:** обеспечение социально-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства свободными площадями по специальной (доступной) цене
- **Открытие:** 15 марта 2018 г.
- **Реализованные риски:** в связи с поздним подписанием договора аренды с МПТИ (ф) СВФУ , срок начала реализации проекта был сдвинут
- **Достижения:** проект признан лучшей муниципальной практикой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата Открытого регионального этапа конкурса «Бизнес-успех» (г. Хабаровск, октябрь 2018 г.)
- **Постпроектный мониторинг:** установлен на 01.10.18-01.03.19

Реализованные муниципальные проекты



ЗАВЕРШЕН

ПРОЕКТ

«Открытие Центра социального предпринимательства»



- **Результат:**

- в процессе реализации проекта индивидуальными предпринимателями зарегистрировано 6 субъектов, что повлекло легализацию предпринимательской деятельности;
- в Центре открыто 13 помещений площадью от 8 кв.м до 53 кв.м;
- в рамках проекта установлена стоимость арендной платы в размере 767 руб./кв.м, при этом арендаторы полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

Реализованные муниципальные проекты



ЗАВЕРШЕН

ПРОЕКТ

«Детский технопарк»



Сроки реализации

запуск	завершение
05.02.18	01.12.18



Финансирование

план	факт
13 813,3 т.р.	13 509,4 т.р.



Ключевые показатели

	план	факт
Уд. вес обучающихся в олимпиадах, конференциях и пр. различного уровня	20%	20%
Удовлетворенность населения качеством оказания услуг	88,5%	88,5%
Количество проведенных районных соревнований технического направления	3 ед.	3 ед.
Количество вновь оснащенных мест высокотехнологичным оборудованием	20 шт.	20 шт.
Доля детей 7-18 лет, охваченных программами научной и технической направленности	23%	23%

- **Продукт:** детский технопарк с лабораториями «Робоквантум», «Промышленный дизайн», высокотехнологичным цехом «Hi-teck»
- **Открытие:** 26 октября 2018 г.
- **Реализованные риски:**
 - в связи со старой коммуникацией здания проведен ремонт системы отопления помещений детского технопарка;
 - несоответствующие размеры помещений ЦДО под габариты оборудования;
 - ненадлежащее качество поставленного товара (сантехнические кабинки)
- **Постпроектный мониторинг:** не установлен

Реализованные муниципальные проекты



ЗАВЕРШЕН

ПРОЕКТ «Детский технопарк»



• Результат:

- создание современного детского технопарка, оснащенного 20 рабочими местами и высокотехнологичным оборудованием;
- в период сентябрь-декабрь 2018 г. охват детей по техническому направлению составил 326 чел.;
- Реализуются 6 инновационных дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования школьников среднего и старшего возраста;
- достижение высоких результатов воспитанников и преподавателей Детского технопарка на районных, республиканских и международных соревнованиях.

Постановочные вопросы перед Центральным проектным комитетом РС(Я)



Решение вопросов по ведению проектов через единую платформу, объединяющую все инструменты проектирования и понятный функционал: *продолжить работу в ГИС УПД или установить собственный программный продукт, который позволил бы:*

- *вести всю переписку в одном месте;*
- *автоматически собирал отчеты;*
- *минимизировал время на составление проектов, совещания и т.п.*



Упрощение процесса проектного документооборота и уход от формализации проектных процессов:

- *рассмотреть возможность ведения документации полностью в электронном виде;*
- *упростить заполняемые формы и т.п.*

Постановочные вопросы перед Центральным проектным комитетом РС(Я)



Повысить качество работы сотрудников ЦПК РС(Я) с муниципальными проектными комитетами и офисами:

- *получение ответов на возникшие вопросы в сфере проектного управления;*
- *своевременное освещение информации о деятельности органов управления в сфере проектного управления и т.п.*



Проведение обучения сотрудников МПК и МПО, иных участников проектной деятельности:

- *требуется практикоориентированное обучение специалистов, получивших базовое обучение;*
- *необходимо обучение вновь прибывших участников проектов в направлении повышения конкретных компетенций;*
- *сертифицировать сотрудников по международным стандартам.*

Задачи МПК и МПО на 2019 год



Продолжение реализации проектов, запущенных в 2018 году:

- *«Строительство корпуса спортивного зала МБОУ "Политехнический лицей" в г. Мирный»;*
- *«Внедрение автоматизированной системы оплаты за школьное питание в общеобразовательных учреждениях г. Мирный»;*
- *«Создание гибкой системы финансовой поддержки СМСП на базе НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района»*



Запуск новых проектов:

- *«Цифровой образовательный центр»;*
- *«Дворец детства»;*
- *иные*

Задачи МПК и МПО на 2019 год



Разработка и развитие нормативно-методологической базы на основе шаблонов ЦПК РС(Я):

- *Регламент управления портфелями проектов;*
- *Модель компетенций муниципальных служащих, сотрудников учреждений и иных участников проектов на участие в проектной деятельности;*
- *корректировка составов МПК и МПО, иных МПА в сфере проектной деятельности (по мере необходимости)*



Обучение по курсам проектного управления



Обеспечение деятельности МПК и МПО



Опубликование информации о развитии проектного управления в СМИ



**Итоги работы
муниципального проектного комитета
и муниципального проектного офиса
за 2018 год
и задачи на 2019 год**

г. Мирный
февраль 2019 г.
